
24 January 2022

Lombardia

Milano

LOMBARDIA, ANAS: CONCLUSA L'OTTAVA SETTIMANA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA




Anas (Gruppo FS Italiane) ha concluso i primi 55 giorni di attività al cantiere di Colonno (CO) lungo la strada statale 340 "Regina".

Nella settimana appena trascorsa, per quanto riguarda il muro lato lago è proseguita la realizzazione dei micropali di fondazione, unitamente al getto di altri conci di fondazione, alla posa delle armature di elevazione e alla posa delle bilastre prefabbricate per il getto di completamento dell'elevazione.

Inoltre, proseguono gli scavi di sbancamento per la formazione dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonna (salto di montone), unitamente alla posa delle reti corticali e delle relative chiodature, sul versante sovrastante.

Proseguono le attività di posa delle barriere paramassi sul versante sovrastante il futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), in cui avanzano gli scavi di sbancamento e la formazione delle piste di arrocco, parallelamente alle attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante sovrastante.

Galleria fotografica

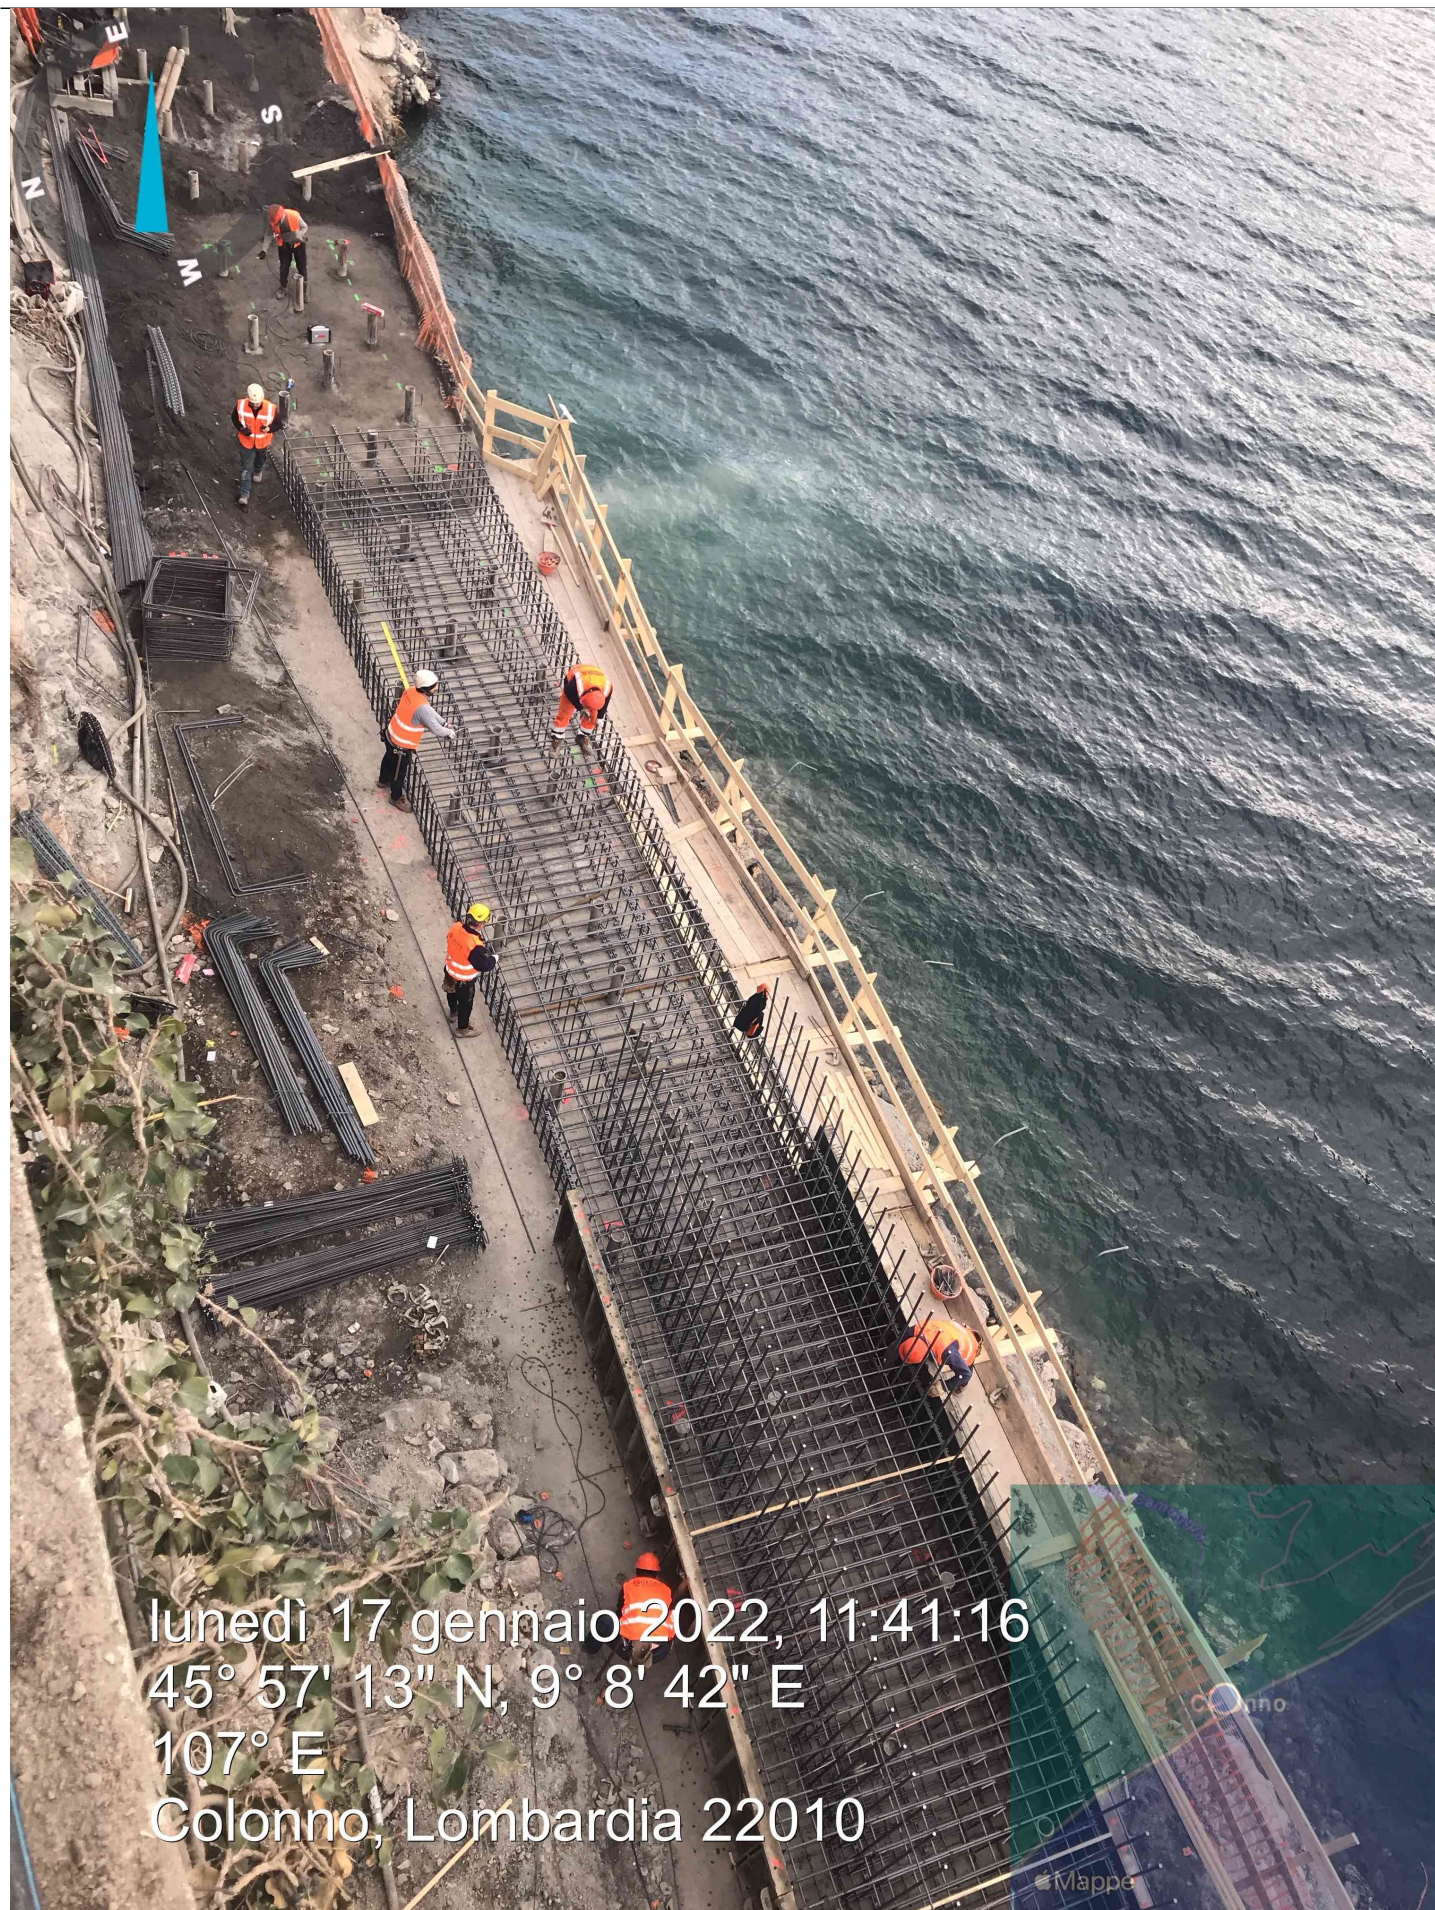

lunedì 17 gennaio 2022, 11:41:16
45° 57' 13" N, 9° 8' 42" E
107° E
Colonno, Lombardia 22010













