

---

24 Gennaio 2022

Lombardia

Milano

## **LOMBARDIA, ANAS: CONCLUSA L'OTTAVA SETTIMANA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA**



Anas (Gruppo FS Italiane) ha concluso i primi 55 giorni di attività al cantiere di Colonno (CO) lungo la strada statale 340 "Regina".

Nella settimana appena trascorsa, per quanto riguarda il muro lato lago è proseguita la realizzazione dei micropali di fondazione, unitamente al getto di altri conci di fondazione, alla posa delle armature di elevazione e alla posa delle bilastre prefabbricate per il getto di completamento dell'elevazione.


---

Inoltre, proseguono gli scavi di sbancamento per la formazione dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone), unitamente alla posa delle reti corticali e delle relative chiodature, sul versante sovrastante.

Proseguono le attività di posa delle barriere paramassi sul versante sovrastante il futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), in cui avanzano gli scavi di sbancamento e la formazione delle piste di arrocco, parallelamente alle attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante sovrastante.

## **Galleria fotografica**



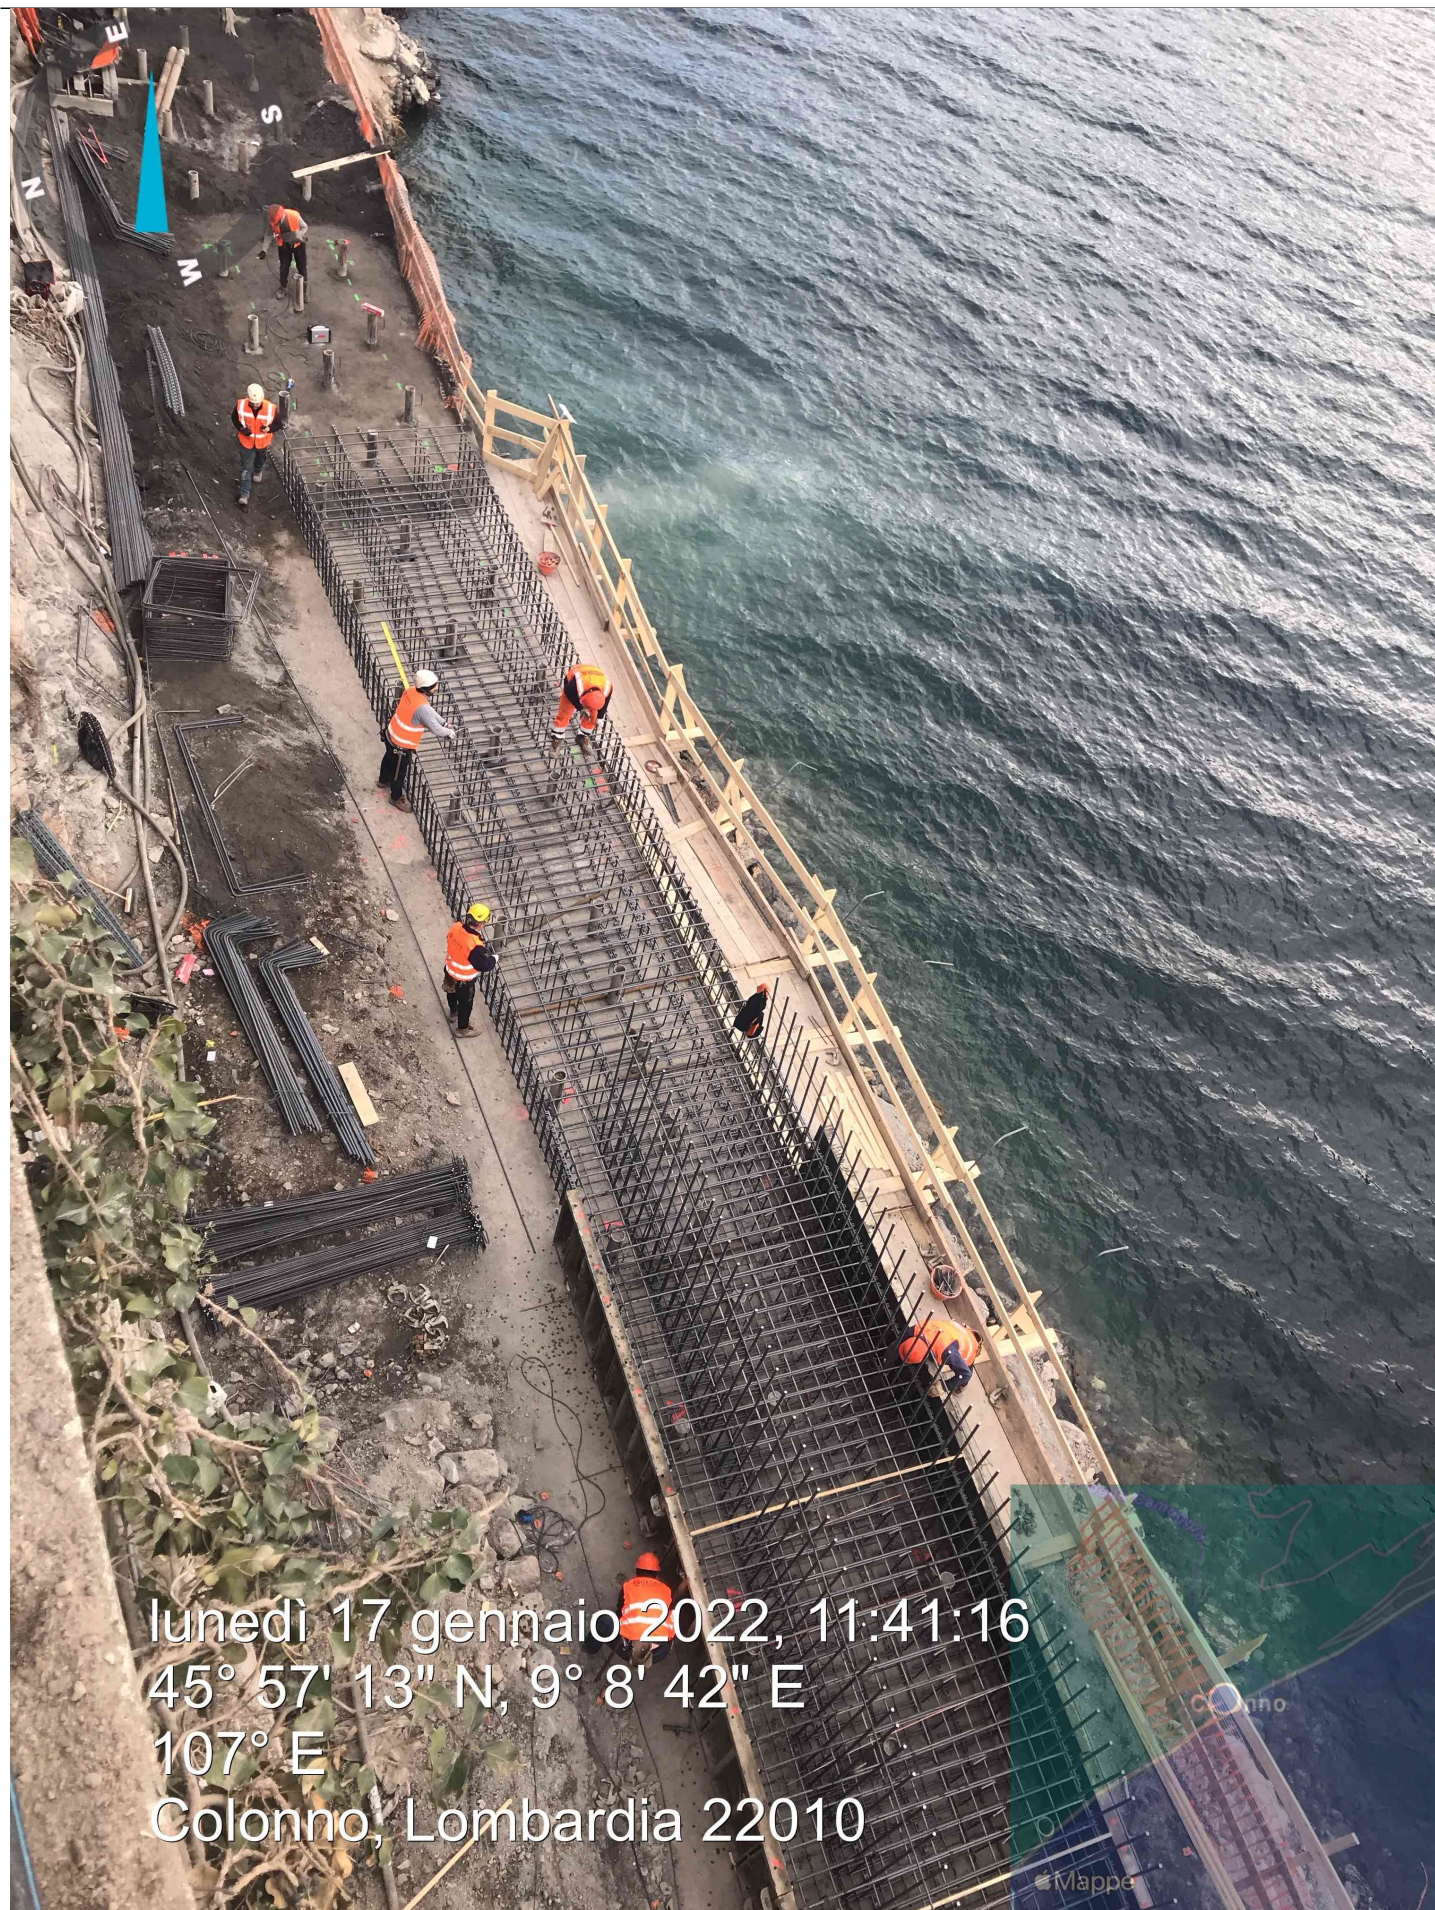

lunedì 17 gennaio 2022, 11:41:16  
45° 57' 13" N, 9° 8' 42" E  
107° E  
Colonno, Lombardia 22010











































